

REGIONE LAZIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N° 001796 **DEL:** -4 OTT. 2023
STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Tecnica
OGGETTO: Presa d'atto del servizio erogato dalla ditta C.& B. Decor Art manutenzione straordinaria edile presso i PP.OO. di Tivoli e Palestrina, per un importo di € 149.360,77 oltre iva.

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Filippo Coiro

 Favorevole Non favorevole (vedi motivazioni allegate)

 data -4 OTT. 2023
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO f.f. Dott. Franco Cortellessa

 Favorevole Non favorevole (vedi motivazioni allegate)

 data -4 OTT. 2023

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

 Senza osservazioni Con osservazioni (vedi allegato)

Il Presidente _____ data _____

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

 Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: 101020301-

 Registrazione n. 2023/2170- del 02-10-2023

 Il Direttore U.O.C. Bilancio e Contabilità ad Interim (Dott. Fabio Filippi) Filippi

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento proponente, con la sottoscrizione del presente atto a seguito dell'istruttoria effettuata attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

 Il RUP
Ing. Elisa Moroncelli

 Il Direttore ad Interim UOC Tecnica
Ing. Elisa Moroncelli

E. Moroncelli
E. Moroncelli

La presente deliberazione è costituita da n. 3 pagine e da n. 1 allegati composti da un totale di n. 48 pagine.

PROPOSTA

Il Direttore f.f. UOC Tecnica relaziona al Direttore Generale quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

PREMESSO che

che ai sensi e per gli effetti della Deliberazione n.933 del 19/07/2019, parzialmente modificata con Deliberazione n.1126 del 10/09/2019, con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale pubblicato sul B.U.R.L. n.84 del 17/10/2019 e della deliberazione n.993 del 07/06/2022 con la quale sono state proposte modifiche all'Atto Aziendale approvate con determina regionale G07864 del 16/06/2022 e pubblicate sul B.U.R.L. n.56, suppl.I, del 05/07/2022;

che con deliberazione n. 1466 del 31/07/2023 veniva nominata l'ing. Elisa Moroncelli quale Direttore UOC Ingegneria Clinica e che con nota prot. 35209 del 30/08/2023 venivano assegnate ad interim all'ing. Elisa Moroncelli le funzioni di Dirigente sostituto del Direttore della U.O.C. tecnica- Dipartimento Tecnico;

PRESO ATTO

della necessità di manutenzione straordinaria edile presso i PP.OO. di Tivoli e Palestrina;

TENUTO CONTO

dell'immediata disponibilità da parte della ditta C. & B. Decor Art ad eseguire tali fattispecie di lavorazioni in tempi ritenuti consoni all'urgenza del caso e dell'importo di tali lavorazioni;

RITENUTO

necessario dover procedere alla Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione RdO MePA N. 3768080, con unico operatore Ditta C.& B. Decor Art per un importo lavori pari ad € 149.360,77;

CONSIDERATO

l'art. 50 comma 1a del Nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 36 del 31.03.2023 secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

....comma 1a: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante

RICHIAMATO

Il verbale inviato con mail al Direttore ad Interim UOC Tecnica ing. Elisa Moroncelli in data 08/03/2023 dalla Direzione Generale e conservato agli atti della scrivente;

PRESO ATTO

della necessità di ricorrere a soggetti qualificati iscritti al Mepa ed in possesso dei requisiti di idoneità tecnico economica; di garantire il principio di rotazione a favore di detti soggetti e a garanzia della razionale gestione delle attività;

ATTESO

che, come previsto dall'ANAC si è proceduto all'iscrizione il seguente codice CIG **A016859F17**;
che i lavori verranno eseguiti su fondi di Bilancio 2023, sul c.m. 101020301 "Fabbricati Strumentali Indisponibili".

RITENUTO

sulla base di quanto sopra esposto, di prendere atto del servizio erogato dalla ditta C. & B. Decor Art con sede in, Via Dei Savelli n. 106 – 00040 Rocca Priora Roma P. IVA/C.F. 08667171006, per la manutenzione straordinaria edile presso i PP.OO. di Tivoli e Palestrina, per un importo di € 149.360,77 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 32.859,36 per un totale complessivo di € 182.220,13;

Per tutto quanto espresso, nelle premesse ed in narrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

PROPONE

1. di prendere atto del servizio erogato dalla ditta C. & B. Decor Art con sede in, Via Dei Savelli n. 106 – 00040 Rocca Priora Roma P. IVA/C.F. 08667171006, per la manutenzione straordinaria edile presso i PP.OO. di Tivoli e Palestrina, per un importo di € 149.360,77 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 32.859,36 per un totale complessivo di € 182.220,13;
2. di imputare sul bilancio 2023, la somma di € 149.360,77, oltre IVA (22%) corrispondente ad € 32.859,36 per un totale complessivo di € 182.220,13 sul codice mastro 101020301 "Fabbricati Strumentali Indisponibili";
3. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on – line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n.69 del 18.06.2009.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore ad Interim UOC Tecnica

Ing. Elisa Moroncelli



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere Favorevole
Data 1-4 OTT. 2023

Parere Favorevole
Data 1-4 OTT. 2023

Il Direttore Amministrativo
Dott. Filippo Coiro

Il Direttore Sanitario f.f.
Dott. Franco Cortellessa



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giorgio Giulio Santonocito, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00096 del 11/07/2022.

VISTA la superiore proposta di deliberazione, formulata dall'Ing. Elisa Moroncelli (Direttore ad Interim UOC Tecnica), che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

RITENUTO di condividere il contenuto della medesima proposta;


DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'Ing. Elisa Moroncelli (Direttore ad Interim UOC Tecnica)

di disporre che il presente atto **venga pubblicato** nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'Art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Filippo Coiro

Il Direttore Sanitario f.f.
Dott. Franco Cortellessa



Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Giulio Santonocito



PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede

Legale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data: 4 OTT 2023

**Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Dott. Enzo Fasani**

L'addetto alla Pubblicazione

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

**Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Dott. Enzo Fasani**

Tivoli, _____

Prot 39375- 21/10/23

Offerta Economica relativa a

Descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO GLI P.P.OO. DI TIVOLI E PALESTRINA

RdO nr. 3768080

Numero lotto 0

Amministrazione titolare del procedimento

Ente acquirente

ASL ROMA 5

Ufficio

UOC TECNICA

Codice fiscale

04733471009

Codice univoco ufficio Non presente

Indirizzo sede

Via acquaregna n. 1/15

Città

Tivoli

Recapito telefonico

3336131024

Email

ELISA.MORONCELLI@ASLROMA5.IT

Punto ordinante

ELISA MORONCELLI



Concorrente

Forma di partecipazione

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

C&B DECOR ART

Partita IVA

08667171006

Tipologia societaria

Società in nome collettivo (SNC)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Percentuali a ribasso

Nome	Valore
149360,77	0

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO GLI P.P.OO. DI TIVOLI E PALESTRINA

Dati Principali

Numero RDO

3768080

Nome RDO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO GLI P.P.OO. DI TIVOLI E PALESTRINA

Tipologia di contratto

Appalto di lavori

Tipologia di procedura

Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimento

ELISA MORONCELLI

MRNLSE80E43H501L

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

ELISA MORONCELLI MRNLSE80E43H501L

Stazione AppaltanteAMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > ASL ROMA 5**Ente Committente**AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > ASL ROMA 5

Date

Pubblicazione

 28/09/2023 12:31

Inizio presentazione offerte

 28/09/2023 12:31

Termine ultimo presentazione offerte

 02/10/2023 09:00

Data limite stipula contratto

 06/10/2023 09:00

Data limite di consegna beni/decorrenza

 12/10/2023 09:00

Dettaglio

Criterio Aggiudicazione
Minor Prezzo**CIG**
A016859F17**CUP**
-


CPV Identificativo	Descrizione	Categoria	Fornitura
45262500-6	Lavori edili e di muratura	OG 1 Edifici civili e industriali	100

Formulazione offerta economica
PERCENTUALI A RIBASSO

Nome Parametro	Peso	Decimali offerta
149360,77	1	1

Termini di pagamento
60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA**Importo base d'asta**
€ 149.360,77**Dati consegna e fatturazione**

Consegna: VIA ACQUAREGNA N. 1/15 TIVOLI (ROMA); Aliquote: secondo la normativa vigente

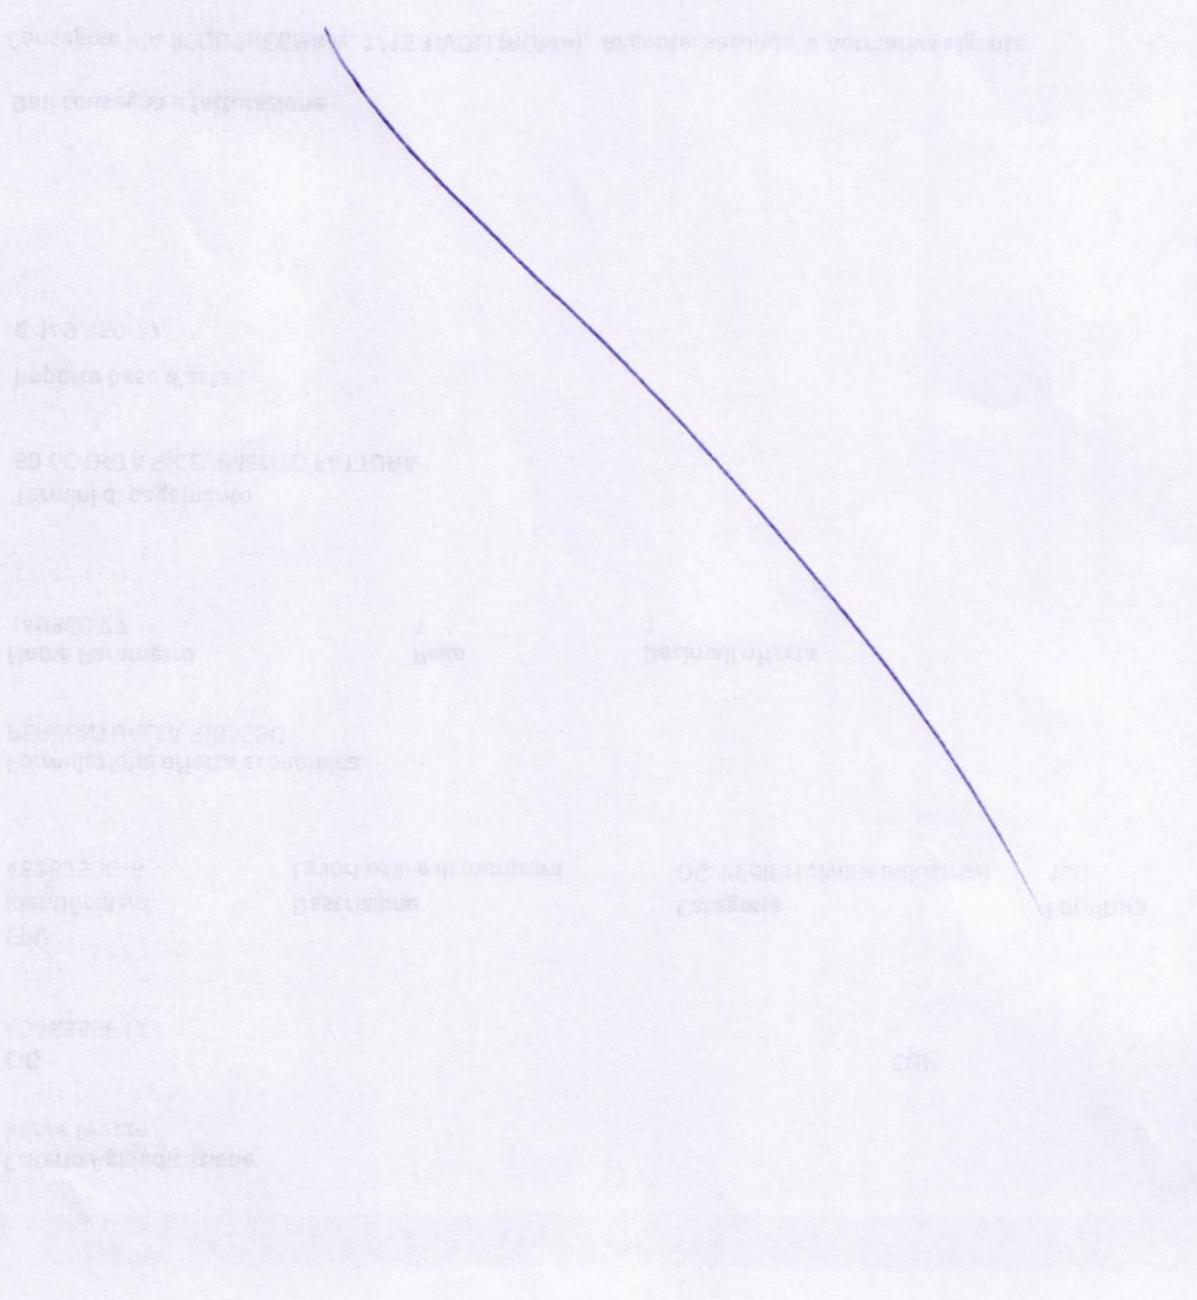

Documentazione Gara



COMP METR TIV E PALESTR.pdf

10074.4 Kb

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO GLI P.P.OO. DI TIVOLI E PALESTRINA

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

08667171006

C&B DECOR ART

ASL RM 5
Provincia di Roma

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO PRESIDI DI PALESTRINA E DI TIVOLI

COMMITTENTE: ASL ROMA 5

Data, 27/09/2023

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	01) CORPO VECCHIO TIVOLI (SpCat 1) OPERE EDILI (Cat 1) Demolizioni e Rimozioni (SbCat 1)							
1 / 48 A03.01.019.a .01	Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di pietrame calcareo: della sezione fino a 100 cmq Assistenza muraria impianti		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	32,02	1'280,80
2 / 49 A03.01.003.a	Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, per ripresa in breccia, a ... ragione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in mattoni pieni Apertura su scala *(lung.=,5+,5)		1,00	0,500	2,300	1,15		
	SOMMANO mc					1,15	315,39	362,70
3 / 50 A03.03.002.a	Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume Apertura su scala *(lung.=,5+,5) Assistenza		1,00 40,00	0,500 0,050	2,300	1,15 2,00		
	SOMMANO mc					3,15	68,05	214,36
4 / 51 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica, compreso il carico a mano Apertura su scala Assistenza		1,15 40,00	0,050	1,000 1,000	1,15 2,00		
	SOMMANO ton					3,15	36,66	115,48
5 / 52 A03.03.007.b	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati mattoni (EER 17 01 02) a recupero Apertura su scala Assistenza		1,15 40,00	0,050	1,000 1,000	1,15 2,00		
	SOMMANO ton					3,15	24,84	78,25
	A RIPORTARE							2'051,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'051,59
	Ricostruzioni (SbCat 2)							
6 / 39 N.P.01	Restauro del portone esterno dell'ospedale di Tivoli compreso di smontaggio e rimontaggio Restauro				1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	26'000,00	26'000,00
7 / 40 A15.01.002.b	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino							
	Gradini scala	2,00	1,15	0,400		0,92		
	Gradini scala	2,00	1,15	0,150		0,35		
	Gradini scala *(lung.=,4+,4+,4+,4)		1,60	0,100		0,16		
	SOMMANO mq					1,43	151,80	217,07
8 / 41 A12.01.002.a	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predispo ... del trabattello. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia Valutazione per ripristino muri scala demoliti				6,000	6,00		
	SOMMANO mq					6,00	58,38	350,28
9 / 42 A21.01.109	Architrave in acciaio formata da almeno due putrelle entro murature portanti per creazione o allargamento di passaggio, eseguita mediante: breccia nella muratura per l'alloggiament ... tura e mezzi e provvedimenti necessari per non arrecare danni ad opere non interessate al lavoro. Compenso minimo: 40 kg Architrave porta scala	1,00	1,30		20,000	26,00		
	SOMMANO kg					26,00	26,48	688,48
10 / 43 A25027a	Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, ... ti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi: su cemento non armato: Ø foro 40 + 60 mm Passaggio antincendio *(par.ug.=3,00*6)	18,00			0,500	9,00		
	SOMMANO m					9,00	138,40	1'245,60
11 / 44 A14.01.018.b .01	Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 30 x 30 cm: tinta unita naturale Valutazione per rifacimento a seguito di perforazione ai piani				5,000	5,00		
	SOMMANO mq					5,00	60,68	303,40
12 / 45	Botola con telaio in alluminio ed anta in							
	A RIPORTARE							30'856,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							36'222,16
	Compartimentazione ascensori (SbCat 3)							
15 / 104 A03.01.009.e	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: cartongesso spessore fino a 12,5 mm Rimozione parete in cartongesso ascensore verso ospedale		1,20	2,300		2,76		
	SOMMANO mq					2,76	6,40	17,66
16 / 105 A03.01.003.a	Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, per ripresa in breccia, a ... ragione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in mattoni pieni Apertura su ascensore verso ospedale		1,00	2,400	0,350	0,84		
	SOMMANO mc					0,84	315,39	264,93
17 / 106 A03.03.002.a	Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume				1,000	1,00		
	SOMMANO mc					1,00	68,05	68,05
18 / 107 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica, compreso il carico a mano				1,000	1,00		
	SOMMANO ton					1,00	36,66	36,66
19 / 108 A03.03.007.b	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati mattoni (EER 17 01 02) a recupero				1,000	1,00		
	SOMMANO ton					1,00	24,84	24,84
20 / 109 B01.03.003.d	Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiunte il 98% della prova A ... e il lavoro finito a regola d'arte, misurato a materiale costipato: in misto granulare riciclato conforme alla norma UNI Rimpimento dislivello ascensore verso ospedale		1,20	1,000	0,500	0,60		
	A RIPORTARE					0,60		36'634,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					0,60		36'634,30
	SOMMANO mc					0,60	39,20	23,52
21 / 110 A07.03.006.a	Massetto premiscelato pronto all'impiego per lavori di recupero, costituito da malta premiscelata per la realizzazione di sottofondi esterni ed interni ad asciugamento rapido e rit ... Massetto apertura ascensore verso ospedale		1,20	1,000		1,20		
	SOMMANO mq					1,20	35,03	42,04
22 / 111 A07.03.006.b	Massetto premiscelato pronto all'impiego per lavori di recupero, costituito da malta premiscelata per la realizzazione di sottofondi esterni ed interni ad asciugamento rapido e rit ... Massetto apertura ascensore verso ospedale	3,00	1,20	1,000		3,60		
	SOMMANO mq					3,60	4,38	15,77
23 / 112 A14.01.018.b .01	Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 30 x 30 cm: tinta unita naturale Pavimento apertura ascensore verso ospedale Pavimento apertura ascensore verso ospedale		1,20	1,000 1,000		1,20 1,00		
	SOMMANO mq					2,20	60,68	133,50
24 / 113 A12.01.002.a	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzafo o sbruffatura e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predispo ... del trabattello. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia Valutazione per riquadratura a seguito di apertura ascensore verso ospedale				5,000	5,00		
	SOMMANO mq					5,00	58,38	291,90
25 / 114 A21.01.109	Architrave in acciaio formata da almeno due putrelle entro murature portanti per creazione o allargamento di passaggio, eseguita mediante: breccia nella muratura per l'alloggiament ... tura e mezzi e provvedimenti necessari per non arrecare danni ad opere non interessate al lavoro. Compenso minimo: 40 kg Architrave sopra porta a seguito apertura ascensore verso ospedale				40,000	40,00		
	SOMMANO kg					40,00	26,48	1'059,20
26 / 115 A09.04.001.b	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... Chiusura allargamento ascensore verso							
	A RIPORTARE							38'200,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							38'200,23
	ospedale *(lung.=,5+,5)		1,00	2,300		2,30		
	SOMMANO mq					2,30	54,12	124,48
27 / 116 A09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. Chiusura allargamento ascensore verso ospedale *(lung.=,5+,5)		1,00	2,300		2,30		
	Chiusura allargamento ascensore verso direzione *(lung.=,5+,5)	2,00	1,00	2,300		4,60		
	SOMMANO mq					6,90	15,76	108,74
28 / 117 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Chiusura allargamento ascensore verso ospedale		1,50	2,300		3,45		
	Chiusura allargamento ascensore verso direzione *(lung.=,5+,5)	2,00	1,00	2,300		4,60		
	SOMMANO m²					8,05	3,16	25,44
29 / 118 A20.01.013.a .03	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture acriliche al quarzo Chiusura allargamento ascensore verso ospedale		1,50	2,300		3,45		
	Chiusura allargamento ascensore verso direzione *(lung.=,5+,5)	2,00	1,00	2,300		4,60		
	SOMMANO mq					8,05	10,35	83,32
30 / 119 S01.07.001.b	Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da parte dei soggetti individuati dal coordinatore per la progettazione. Operaio qualificato 2° liv. Valutazione per montaggio canale aspirazione ascensore centrale	2,00			8,000	16,00		
	Valutazione per rimontaggio zoccolino-rifacimento parte massetto e riqualificazione per porta ascensore verso direzione	3,00			8,000	24,00		
	SOMMANO ora					40,00	33,70	1'348,00
31 / 120 A09.04.001.e	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/ 7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 40 cm. Compartimentazione ascensore centrale		2,50	26,000		65,00		
	SOMMANO mq					65,00	59,95	3'896,75
	A RIPORTARE							43'786,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							50'454,61
	Finiture (SbCat 5)							
34 / 1 A20.03.008.a	Verniciatura con smalto sintetico opaco, su manufatti in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 3 cm di diametro Verniciatura tubazioni antincendio	3,00			26,000	78,00		
	SOMMANO m					78,00	4,43	345,54
35 / 2 N.P.04	Fornitura e posa in opera di tutto il necessario per il rifacimento del portone d'ingresso del corpo vecchio di Tivoli comprensivo di carteggiatura e verniciatura Portone ingresso corpo vecchio				1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'000,00	3'000,00
36 / 3 A20.02.003.b	Applicazione di una mano di fondo su superfici in legno già preparate, prima di procedere a stuccature, rasature o pitturazioni: con impregnante turapori a solvente Ringhiera Piano Quinto	2,00	1,70	0,900		3,06		
	SOMMANO mq					3,06	7,37	22,55
37 / 4 A20.01.014.a	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: con idrosmalto satinato Smalto su lavabi	18,00	1,00	1,000		18,00		
	SOMMANO mq					18,00	18,98	341,64
38 / 5 A20.01.009.a	Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con stucco emulsionato PIANO QUINTO Stanza *(lung.=2,75+6,15+7,4+4,4+4,65+1,7) Stanza *(lung.=2,7+2,7+1,3+1,3) Stanza *(lung.=4,55+4,55+4,86+4,86+1+1+,15) Wc *(lung.=1,56+1,2+1,05+,65+2,3+1,8)		27,05 8,00 20,97 8,56		3,000 3,000 3,000 1,000	81,15 24,00 62,91 8,56		
	Tinteggiatura pareti da riquilificare ai piani				1350,000	1'350,00		
	SOMMANO mq					1'526,62	10,83	16'533,29
39 / 6 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione PIANO QUINTO Stanza *(lung.=2,75+6,15+7,4+4,4+4,65+1,7) Stanza *(lung.=2,7+2,7+1,3+1,3) Stanza *(lung.=4,55+4,55+4,86+4,86+1+1+,15) Wc *(lung.=1,56+1,2+1,05+,65+2,3+1,8)		27,05 8,00 20,97 8,56		3,000 3,000 3,000 1,000	81,15 24,00 62,91 8,56		
	Tinteggiatura pareti da riquilificare ai piani				1350,000	1'350,00		
	SOMMANO m ²					1'526,62	3,16	4'824,12
40 / 7 A20.01.013.a .03	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con							
	A RIPORTARE							75'521,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							95'515,96
	Infissi (SbCat 4)							
45 / 30 A03.02.029	Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Rimozione infissi	5,00	0,45	2,050		4,61		
	SOMMANO mq					4,61	24,82	114,42
46 / 31 A03.03.002.a	Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume		4,61	0,030		0,14		
	SOMMANO mc					0,14	68,05	9,53
47 / 32 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica, compreso il carico a mano		4,61	0,030		0,14		
	SOMMANO ton					0,14	36,66	5,13
48 / 33 A03.03.007.h	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... o occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati vetro (EER 17 02 02) a recupero		4,61		3,000	13,83		
	SOMMANO kg					13,83	0,61	8,44
49 / 34 A17.03.001.a	Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto ... minimo da contabilizzare 1,50 mq) Serramento ad un battente. Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere. Infissi sostituiti	5,00	0,45	2,050		4,61		
	Valutazione per imbotti	0,30	2,05	0,300	3,000	0,55		
	SOMMANO mq					5,16	914,42	4'718,41
	A RIPORTARE							100'371,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							100'371,89
	Finiture (SbCat 5)							
50 / 8 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco PIANO SEMINTERRATO Stanze pareti Stanze soffitti		80,00		3,000 89,000	240,00 89,00		
	PIANO TERRA Stanze ex sala riunioni (h med)		111,00		2,700	299,70		
	PIANO TERZO Stanze Wc *(H/peso=2,95-2,1) Soffitto		110,00 10,00		3,000 0,850 87,000	330,00 8,50 87,00		
	SOMMANO mq					1'054,20	6,32	6'662,54
51 / 9 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione PIANO SEMINTERRATO Stanze pareti Stanze soffitti		80,00		3,000 89,000	240,00 89,00		
	PIANO TERRA Stanze ex sala riunioni (h med)		111,00		2,700	299,70		
	PIANO TERZO Stanze Wc *(H/peso=2,95-2,1) Soffitto		110,00 10,00		3,000 0,850 87,000	330,00 8,50 87,00		
	SOMMANO m²					1'054,20	3,16	3'331,27
52 / 10 N.P.03	Fornitura e posa in opera di tinteggiatura anti-fumo PIANO TERRA Stanze ex sala riunioni (h med)		111,00		2,700	299,70		
	SOMMANO m2					299,70	20,00	5'994,00
53 / 11 A20.01.013.a .03	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture acriliche al quarzo PIANO SEMINTERRATO Stanze pareti Stanze soffitti		80,00		3,000 89,000	240,00 89,00		
	PIANO TERZO Stanze Wc *(H/peso=2,95-2,1) Soffitto		110,00 10,00		3,000 0,850 87,000	330,00 8,50 87,00		
	SOMMANO mq					754,50	10,35	7'809,08
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							124'168,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							124'168,78
	03) OSPEDALE DI TIVOLI (P4 Ortopedia) (SpCat 3) Demolizioni e Rimozioni (SbCat 1)							
54 / 54 A03.02.029	Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Smontaggio porta ingresso reparto		2,20	2,400		5,28		
	SOMMANO mq					5,28	24,82	131,05
55 / 66 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès Wc sala gessi Wc sala visita				3,300 2,200	3,30 2,20		
	SOMMANO mq					5,50	15,21	83,66
56 / 67 A03.01.019.a .01	Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di pietrame calcareo: della sezione fino a 100 cmq Assistenza muraria		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	32,02	960,60
57 / 68 A25027a	Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, ... ti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi: su cemento non armato: Ø foro 40 + 60 mm Passaggio areazione e scarichi	2,00	0,60			1,20		
	SOMMANO m					1,20	138,40	166,08
58 / 69 A03.03.002.a	Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume Pavimenti Assistenza muraria Porta		5,60 30,00 5,25	0,050 0,050 0,040		0,28 1,50 0,21		
	SOMMANO mc					1,99	68,05	135,42
59 / 70 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano							
	A RIPORTARE							125'645,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							125'763,05
	Ricostruzioni (SbCat 2)							
61 / 72 A09.04.001.e	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 40 cm. Pareti wc stanza		3,70		3,300	12,21		
	SOMMANO mq					12,21	59,95	731,99
62 / 73 A09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. Pareti wc stanza	2,00	3,70		3,300	24,42		
	SOMMANO mq					24,42	15,76	384,86
63 / 74 A09.04.004.f	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. Pareti wc stanza	2,00	3,70		3,300	24,42		
	Detrazione Pareti hydro		3,70		3,300	-12,21		
	Sommano positivi mq					24,42		
	Sommano negativi mq					-12,21		
	SOMMANO mq					12,21	7,36	89,87
64 / 79 A09.04.004.l	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. Pareti wc stanza		3,70		3,300	12,21		
	SOMMANO mq					12,21	19,36	236,39
65 / 80 A14.01.031.b	Pavimentazione di cloruro di polivinile, in rotoli di altezza pari a 2,00 m, di 2 mm di spessore e del peso di 2,8 kg/mq, composto di 3 strati indelaminabili senza rapporto né dire ... nsionale 0,10% in ambedue i sensi, (EN 434). sguscia perimetrale preformata dal medesimo colore, saldata orizzontalmente Rifacimento sguscia *(lung.=2,15+1,7)		3,85			3,85		
	SOMMANO m					3,85	17,82	68,61
66 / 81 A14.02.007.a	Rivestimento in calandrato di cloruro di polivinile con disegno passante su tutto lo spessore e senza alcun rapporto. Lo strato superiore di usura, dello spessore non inferiore a 0 ... ongitudinale, 0,25% trasversale (DIN 51962).							
	A RIPORTARE							127'274,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							127'274,77
	rotoli alti 1,20-1,60 m, spessore di 2,00 mm e del peso di 2,8 kg /mq circa Rifacimento rivestimento		3,85	2,000		7,70		
	SOMMANO mq					7,70	71,13	547,70
67 / 82 A13.01.016.a	Profilo perimetrale per controsoffitti a pannelli di fibra minerale in acciaio preverniciato, con bordi interni in opera: Profilo ad L bianco Controsoffitti wc *(lung.=7,5+6)		13,50			13,50		
	SOMMANO m					13,50	5,82	78,57
68 / 83 A13.01.014.a	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili, decorati con struttura metallica a vista 60x60 cm Controsoffitti wc *(lung.=3,3+2,3)		5,60			5,60		
	SOMMANO mq					5,60	43,41	243,10
69 / 84 A14.01.018.a .01	Pavimento in piastrelle di grès fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 20 x 20 cm: tinta unita naturale Pavimenti wc *(lung.=3,3+2,3)		5,60		3,500	19,60		
	SOMMANO mq					19,60	58,41	1'144,84
70 / 85 A14.02.001.b .01	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: bicottura, dimensioni 20 x 20 cm: superficie bugnata, bianca Rivestimenti wc		13,50		2,000	27,00		
	SOMMANO mq					27,00	69,34	1'872,18
71 / 86 A07.03.007.a	Massetto premiscelato galleggiante pronto all'impiego per lavori di recupero, costituito da cementi, inerti selezionati ed additivi specifici premiscelati per la realizzazione di s ... nte del massetto e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: per uno spessore fino a 40 mm circa Massetto wc		5,60			5,60		
	SOMMANO mq					5,60	46,71	261,58
72 / 87 A07.03.007.b	Massetto premiscelato galleggiante pronto all'impiego per lavori di recupero, costituito da cementi, inerti selezionati ed additivi specifici premiscelati per la realizzazione di s ... etto e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: maggiorazione per ogni 10 mm in più di spessore Massetto wc	3,00	5,60			16,80		
	SOMMANO mq					16,80	5,84	98,11
	----- ----- -----							
	A RIPORTARE							131'520,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							132'486,26
	IMPIANTI MECCANICI (Cat 2) Microschermature di adduzione e scarico (SbCat 6)							
78 / 88 E01.013.a	Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua potabile, fognature e scarichi in pressione, secondo norma UNI EN 1452, completi di anello di giunzione in materiale elastom ... i, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e rinterrati: SDR 13,6 (PN 16): diametro esterno 50 mm, spessore 3,7 mm Tubazione areazione Valutazione per allaccio al piano inferiore		7,00 15,00			7,00 15,00		
	SOMMANO m					22,00	13,28	292,16
79 / 89 E01.058.a	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). Wc					2,000 2,00		
	SOMMANO cad					2,00	197,80	395,60
80 / 90 E01.058.k	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate ... minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 20 (3/4"). Wc					2,000 2,00		
	SOMMANO cad					2,00	223,10	446,20
81 / 91 E01.058.m	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate ... sanitarie con le relative rubinetterie. Allaccio per vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 90. Wc					2,000 2,00		
	SOMMANO cad					2,00	111,55	223,10
82 / 92 E01.065.a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... larini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica Wc					2,000 2,00		
	SOMMANO cad					2,00	352,14	704,28
83 / 93 E01.077.a	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm							
	A RIPORTARE							134'547,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							137'121,70
	04) OSPEDALE DI TIVOLI (P4 Day Surgery) (SpCat 4) OPERE EDILI (Cat 1) Demolizioni e Rimozioni (SbCat 1)							
87 / 55 A03.02.029	Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Smontaggio porta ingresso reparto		1,35	2,150		2,90		
	SOMMANO mq					2,90	24,82	71,98
88 / 56 A03.01.009.e	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: cartongesso spessore fino a 12,5 mm Rimozione filtro esistente		2,30	2,400		5,52		
	SOMMANO mq					5,52	6,40	35,33
89 / 57 A03.03.002.a	Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume Porta Parete		2,90 5,52	0,040 0,100		0,12 0,55		
	SOMMANO mc					0,67	68,05	45,59
90 / 58 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica, compreso il carico a mano Porta Parete		2,90 5,52	0,040 0,100	0,600 1,000	0,07 0,55		
	SOMMANO ton					0,62	36,66	22,73
91 / 59 A03.03.007.b	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati mattoni (EER 17 01 02) a recupero Porta Parete		2,90 5,52	0,040 0,100	0,600 1,000	0,07 0,55		
	SOMMANO ton					0,62	24,84	15,40
	----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							137'312,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							138'142,43
	Finiture (SbCat 5)							
96 / 24 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco Ripristini Ripristini	2,00	2,30	2,400	5,000	11,04 5,00		
	SOMMANO mq					16,04	6,32	101,37
97 / 25 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione Ripristini Ripristini	2,00	2,30	2,400	5,000	11,04 5,00		
	SOMMANO m²					16,04	3,16	50,69
98 / 26 A20.01.013.a .03	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture acriliche al quarzo Ripristini Ripristini	2,00	2,30	2,400	5,000	11,04 5,00		
	SOMMANO mq					16,04	10,35	166,01
	A RIPORTARE							138'460,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							138'460,50
	05) OSPEDALE DI TIVOLI (PT Ingresso) (SpCat 5) Demolizioni e Rimozioni (SbCat 1)							
99 / 60 A03.02.029	Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Smontaggio porta ingresso reparto		1,20	2,150		2,58		
	SOMMANO mq					2,58	24,82	64,04
100 / 61 A03.01.010.f	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: in pannelli isolanti (polistirolo, fibre minerali) Rimozione parte di controsoffitto per ripristino				10,000	10,00		
	SOMMANO mq					10,00	4,32	43,20
101 / 62 A03.01.009.e	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: cartongesso spessore fino a 12,5 mm Rimozione filtro esistente Rimozione parete		2,00 6,00	2,400 2,400		4,80 14,40		
	SOMMANO mq					19,20	6,40	122,88
102 / 63 A03.03.002.a	Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume Porta Parete Controsoffitto		2,58 19,20 10,00	0,040 0,100 0,030		0,10 1,92 0,30		
	SOMMANO mc					2,32	68,05	157,88
103 / 64 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica, compreso il carico a mano Porta Parete Controsoffitto		2,58 19,20 10,00	0,040 0,100 0,030	0,600 1,000 0,600	0,06 1,92 0,18		
	SOMMANO ton					2,16	36,66	79,19
104 / 65 A03.03.007.b	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati mattoni (EER 17 01 02) a recupero Porta		2,58	0,040	0,600	0,06		
	A RIPORTARE					0,06		138'927,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							138'984,33
	Ricostruzioni (SbCat 2)							
105 / 99 A14.01.018.b .01	Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 30 x 30 cm: tinta unita naturale Riqualificazione pavimento dopo rimozione parete		6,00	1,000		6,00		
	SOMMANO mq					6,00	60,68	364,08
106 / 100 A14.02.010.a	Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima scelta delle dimensioni di 8/10 x 20/30 cm posto in opera con malta bastarda compresa stuccatura, sigillatura e pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale Rifacimento parte zoccolino		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	20,91	209,10
107 / 101 A12.01.002.a	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da un primo strato di rinaffo o sbruffatura e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predispo ... del trabattello. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia Valutazione per Rispristino dopo demolizioni				8,000	8,00		
	SOMMANO mq					8,00	58,38	467,04
108 / 102 A09.04.009.a	Realizzazione di velette, riseghe, spigoli, e cassettoni di rivestimento di scarichi, colonne montanti, canne fumarie ecc... con lastre prefabbricate in cartongesso di qualsiasi ti ... eso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Realizzazione di velette, riseghe e spigoli su pareti e contropareti. Veletta controsoffitto Rifilatura tracantone a seguito rimozione parete		5,00			5,00		
			4,00			4,00		
	SOMMANO m					9,00	62,53	562,77
109 / 103 A13.01.014.a	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili, decorati con struttura metallica a vista 60x60 cm Controsoffitto Controsoffitto aggiuntivo Scala				5,000	5,00		
					10,000	10,00		
					7,000	7,00		
	SOMMANO mq					22,00	43,41	955,02
	A RIPORTARE							141'542,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
M	LAVORI A MISURA euro	149'360,77	100,000
M:001	01) CORPO VECCHIO TIVOLI euro	91'322,27	61,142
M:001.001	OPERE EDILI euro	91'322,27	61,142
M:001.001.001	Demolizioni e Rimozioni euro	2'051,59	1,374
M:001.001.002	Ricostruzioni euro	34'170,57	22,878
M:001.001.003	Compartimentazione ascensori euro	9'469,95	6,340
M:001.001.004	Infissi euro	4'762,50	3,189
M:001.001.005	Finiture euro	40'867,66	27,362
M:002	02) DIREZIONE AZIENDALE euro	32'846,51	21,991
M:002.001	OPERE EDILI euro	32'846,51	21,991
M:002.001.001	Demolizioni e Rimozioni euro	70,44	0,047
M:002.001.002	Ricostruzioni euro	4'123,25	2,761
M:002.001.004	Infissi euro	4'855,93	3,251
M:002.001.005	Finiture euro	23'796,89	15,932
M:003	03) OSPEDALE DI TIVOLI (P4 Ortopedia) euro	12'952,92	8,672
M:003.001	OPERE EDILI euro	8'317,48	5,569
M:003.001.001	Demolizioni e Rimozioni euro	1'594,27	1,067
M:003.001.002	Ricostruzioni euro	5'757,80	3,855
M:003.001.004	Infissi euro	332,07	0,222
M:003.001.005	Finiture euro	633,34	0,424
M:003.002	IMPIANTI MECCANICI euro	4'635,44	3,104
M:003.002.006	Microscermature di adduzione e scarico euro	4'635,44	3,104
M:004	04) OSPEDALE DI TIVOLI (P4 Day Surgery) euro	1'338,80	0,896
M:004.001	OPERE EDILI euro	1'338,80	0,896
M:004.001.001	Demolizioni e Rimozioni euro	191,03	0,128
M:004.001.002	Ricostruzioni euro	829,70	0,556
M:004.001.005	Finiture euro	318,07	0,213
M:005	05) OSPEDALE DI TIVOLI (PT Ingresso) euro	4'747,56	3,179
M:005.001	OPERE EDILI euro	4'747,56	3,179
M:005.001.001	Demolizioni e Rimozioni euro	523,83	0,351
M:005.001.002	Ricostruzioni euro	2'558,01	1,713
M:005.001.005	Finiture euro	1'665,72	1,115
M:006	06) OSPEDALE DI PALESTRINA euro	6'152,71	4,119
M:006.001	OPERE EDILI euro	6'152,71	4,119
M:006.001.001	Demolizioni e Rimozioni euro	544,57	0,365
M:006.001.002	Ricostruzioni euro	2'345,10	1,570
M:006.001.005	Finiture euro	3'263,04	2,185
	TOTALE euro	149'360,77	100,000
	Data, 27/09/2023		
	Il Tecnico		

	A RIPORTARE		

Simog

Accessibilità

Contattaci

Privacy-

Cookies



ANAC

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Anticorruzione

Servizi per le amministrazioni pubbliche

Missione e competenze

Amministrazione Trasparente

Home / Servizi per le amministrazioni pubbliche / Servizio Simog

Logout

Gestione Schede

Elenco CIG acquisiti

Lista CIG/CUP da integrare

Rubrica Operatori Economici

Rubrica incaricati

Guida al Servizio

Utente: Moroncelli Elisa Profilo corrente: RUP

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5 - UFFICIO TECNICO

Visualizzazione Lotto

[Ritorna](#)

gara di cui fa parte il lotto

Stazione Appaltante

Denom.ne della Stazione Appaltante competente	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
Codice Fiscale Amministrazione Competente	04733471009
Codice AUSA	0000218828
Codice univoco centro di costo	99
Denominazione del centro di costo nell'ambito della Stazione Appaltante	UFFICIO TECNICO
RUP che ha in carico la gara	MRNLSE80E43H501L
Numero Gara	9348878 (da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte della SA)
Oggetto della Gara	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO PP.OO. DI TIVOLI E PALESTRINA
Data Creazione	28/09/2023
Importo complessivo Gara	N.D.
Importo contributo SA	N.D.
Numero totale dei Lotti	1
Settore attivita' della SA	Ordinario
Modalita' di indizione	
Modalita' di indizione servizi di cui all'allegato IX	
Modalita' di realizzazione	Contratto d'appalto
Strumenti per lo svolgimento delle procedure	Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione Art.58
Motivo urgenza	
CIG relativo all'accordo quadro/convenzione cui si aderisce	
Stato gara	In Definizione
Data Cancellazione	
Data perfezionamento bando	
Gara esclusa dall'acquisizione obbligatoria dei requisiti ai fini FVOE	NO
Estrema urgenza/Esecuzione di lavori di somma urgenza	NO
Link ai documenti relativi all'affidamento diretto in somma urgenza e protezione civile	
Motivazione richiesta CIG	Contratto non attivo presso il soggetto aggregatore (di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del rilascio del CIG
La stazione appaltante agisce per conto di altro soggetto?	

dati del lotto

Lotto - CIG [A016859F17]

Oggetto Lotto* MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO PP.OO. DI TIVOLI E PALESTRINA

Importo* 149.360,77

di cui per

opzioni/ripetizioni

di cui per

attuazione della

sicurezza

<input type="checkbox"/> CPV	
CPV Prevalente*	45454100-5
Descrizione	Lavori di restauro
CPV	Descrizione

Scelta del
Contraente*

Affidamento diretto

Categoria
merceologica di
cui al DPCM
soggetti
aggregatori*

Manutenzione immobili e impianti

Tipo appalto
riservato

Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando oppure senza previa indizione di una gara

Procedura a seguito di precedente gara annullata o deserta o senza esito	<input type="checkbox"/>
Lavori, beni e Servizi infungibili per opera d'arte	<input type="checkbox"/>
Lavori, beni e Servizi infungibili per motivi tecnici	<input type="checkbox"/>
Lavori, beni e Servizi infungibili per diritti esclusivi	<input type="checkbox"/>
Estrema urgenza	<input type="checkbox"/>
Scopo di ricerca	<input type="checkbox"/>
Consegne complementari	<input type="checkbox"/>
Forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime	<input type="checkbox"/>
Condizioni particolarmente vantaggiose	<input type="checkbox"/>
Il fase Concorso di progettazione e idee	<input type="checkbox"/>
Ripetizione lavori o servizi analoghi	<input type="checkbox"/>
Procedura di affidamento a contraente vincolato da disposizioni sovraordinate	<input type="checkbox"/>

Oggetto

principale del
contratto*

Lavori

Uso di metodi e
strumenti
elettronici di
modellazione per
l'edilizia e le
infrastrutture?

Contratto
escluso*

NO

Esclusione

Contratto regime
particolare di
appalto (speciale
o alleggerito)

NO

Regime
particolare di
appalto

Codice del luogo
di esecuzione del
contratto (ISTAT)

058104

IT43

Codice del luogo
di esecuzione del
contratto (NUTS)

Il lavoro o
l'acquisto di bene
o servizio e' stato
previsto
all'interno della
programmazione

NO ▼

Prima annualita'
dell'ultimo
programma nel
quale e' stato
inserito

l'intervento o
l'acquisto
(formato aaaa)

Durata
dell'affidamento
in giorni*

365

Estremi programma annuale

CUI programma
triennale lavori
pubblici o
programma
biennale forniture
e servizi

Ripetizioni e rinnovi

L'appalto prevede
ripetizioni o altre
opzioni?

NO ▼

Durata dei rinnovi
e delle ripetizioni
in giorni

0

L'appalto deriva
da una delle
seguenti ipotesi
di collegamento?*

No, nessuna ipotesi di collegamento ▼

CIG collegato

L'appalto o
concessione e'
afferre gli
investimenti
pubblici
finanziati, in tutto
o in parte, con le
risorse previste
dal PNRR (Piano
Nazionale di
Ripresa e
Resilienza) e/o
dal PNC (Piano
nazionale per gli
investimenti
complementari)?*

NO ▼

L'appalto e'
finalizzato alla
realizzazione di
progetti
d'investimento

SI ▼

pubblico per i
quali e' prevista
l'acquisizione del
codice CUP ai
sensi dell'art. 11
L.3/2003 e
ss.mm.? (E'
necessario
acquisire e
comunicare il
CUP per
interventi
finanziati, anche
in parte, con
risorse
Comunitarie)*

☐ Codici CUP

CUP	Confermato	Valido	Dati DIPE	Tematic PNRR
G33D23000270002	No	Si	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO PP.OO. DI TIVOLI E PALESTRINA*VIA PARROZZANI*MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO PP.OO. DI TIVOLI E PALESTRINA	

Tipologie Appalto

☐ Tipologia lavoro (se presente la componente lavori)

Restauro	<input type="checkbox"/>
Manutenzione ordinaria	<input type="checkbox"/>
Manutenzione straordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Costruzione	<input type="checkbox"/>
Demolizione	<input type="checkbox"/>
Recupero	<input type="checkbox"/>
Ristrutturazione	<input type="checkbox"/>

☐ Modalita di acquisizione forniture / servizi

Acquisto	<input type="checkbox"/>
Leasing	<input type="checkbox"/>
Noleggio	<input type="checkbox"/>
Acquisto a riscatto	<input type="checkbox"/>

Categoria prevalente o scorporabile

Descrizione Categoria	Scorporabile Prevalente	
ALTRO (Stazioni appaltanti con sistema di qualificazione proprio)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
FORNITURA DI BENI	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
FORNITURA DI SERVIZI	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
OG 1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
OG 10 - IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
OG 11 - IMPIANTI TECNOLOGICI	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
OG 12 - OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
OG 13 - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
OG 2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
Tutela delle pari opportunità generazionali e di genere nonché per l'inclusione delle persone con disabilità		

Previsione nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o

strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (articolo 47, comma 4, D.L. 77/2021)?

Previsione di una quota inferiore con riferimento all'occupazione giovanile

Previsione di una quota inferiore con riferimento all'occupazione femminile

☒ Motivo deroga

importo ridotto del contratto

mercato di riferimento

affidamento in somma urgenza o per esigenze di protezione civile

adempimento clausola sociale di riassorbimento occupazionale

scarsa occupazione femminile nel settore

necessità di esperienza o di particolari abilitazioni professionali

assunzione di un numero di lavoratori inferiori a tre

altro

Previsione nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito di ulteriori misure premiali che attribuiscono un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato

☒ Misure Premiali

nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del D.Lgs 9 luglio 2003, n. 216, dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, degli articoli 35 e 55-quinquies del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ovvero dell'articolo 54 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151

utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro

si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone disabili per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali

si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali

si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione giovani di età inferiore a trentasei anni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali

abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali

abbia, nell'ultimo triennio, adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali

abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di lavoro delle persone disabili

abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254

altro criterio di responsabilità sociale nei confronti dei divari di genere

altro criterio di responsabilità sociale nei confronti dei divari intergenerazionali

altro criterio per l'inclusione dei lavoratori disabili

CONTATTI

protocollo@pec.anticorruzione.it

Contact Center

800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

QUICKLINKS

[Portale istituzionale](#)

[Portale servizi](#)


V3.04.9.2 (Build 08)

[Note legali](#)

[Copyright](#)

[Privacy-Cookies](#)

[Accessibilità](#)

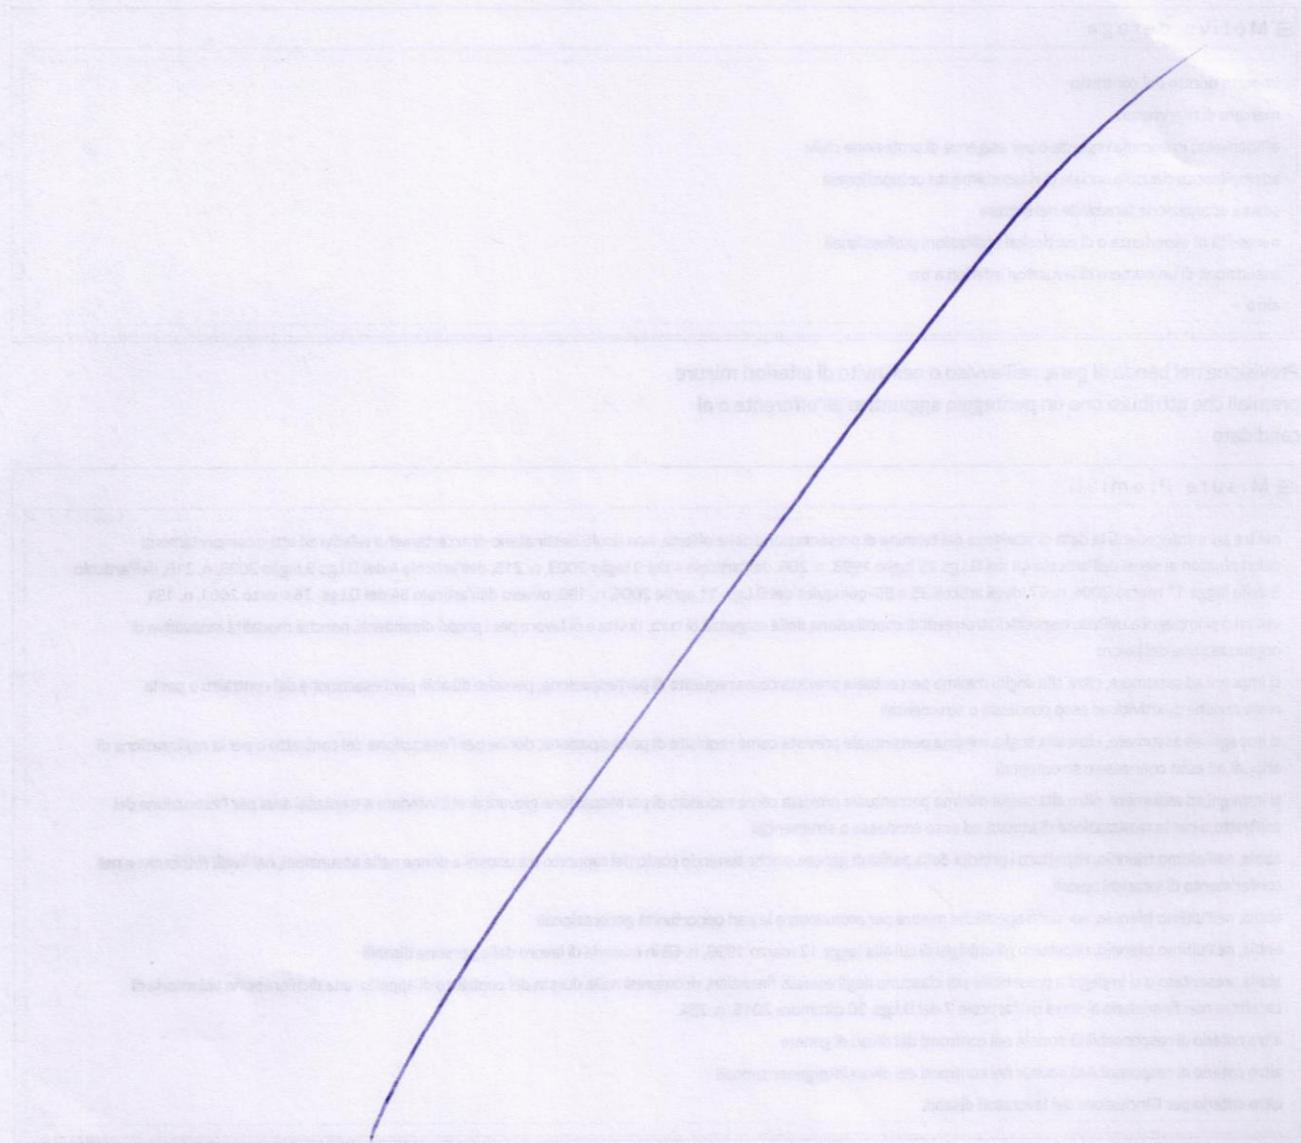



Presidenza del Consiglio dei Ministri
-Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica -

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO	G33D23000270002
-DESCRIZIONE DEL PROGETTO-	
Localizzazione	Comune di TIVOLI (RM)
Descrizione sintetica del progetto	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO PP.OO. DI TIVOLI E PALESTRINA*VIA PARROZZANI*MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO PP.OO. DI TIVOLI E PALESTRINA
Anno di decisione	2023
Opera/infrastruttura interessata dal progetto	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO PP.OO. DI TIVOLI E PALESTRINA
Strumento di programmazione	ASSENTE
Legge Obiettivo	N
Indirizzo o Area geografica di riferimento	VIA PARROZZANI
Bene o servizio	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO PP.OO. DI TIVOLI E PALESTRINA
-CARATTERISTICHE DEL CUP-	
Cumulativo	No
Provvisorio	No
Tipologia relativa allo stato Master (Normale: non è Master né è associato ad alcun Master, Master: progetto Master, Collegato: progetto associato ad un Master)	Normale
Stato	Attivo
-ANAGRAFICA DEL SOGGETTO-	
Soggetto Richiedente	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
Concentratore	N
Soggetto Titolare	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
Categoria Soggetto Titolare	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI
Unità Organizzativa	SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA
-CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO-	
Natura	ACQUISTO DI BENI
Tipologia	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Settore	INFRASTRUTTURE SOCIALI
Sottosettore	SANITARIE
Categoria	STRUTTURE OSPEDALIERE
-DATI FINANZIARI DEL PROGETTO-	
Sponsorizzazione	NO
Costo totale del progetto (in euro)	149.370,00
Importo in lettere in euro	centoquarantanovemilatrecentosettanta

Contatti:

Sito <http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/>

Numero verde Help-Desk CUP 800.811.172

